




โครงการชลประทานระยอง



รายงานสถานการณ์น้ำ จ.ระยอง

ศุกร์ 13 มกราคม 2566

ชื่อ	น้ำฝน	ระดับน้ำ 06.00 น. 13 มกราคม 2566				
	(มม.)	เหนือ	ท้าย	ช่อง	ยกบานสูง	ปริมาณน้ำผ่าน
	12 ม.ค. 66	ม.(รทก.)	ม.(รทก.)			
1. ปตร./ทรบ.						
1.1 รัฐอำนวยการ	-	+0.40	+0.30	2	-	-
1.2 ทรบ.คลองคา	-	+0.30	+0.25	3	-	-
1.3 สายสาม	-	+0.40	+0.30	2	-	-
1.4 น้ำพุ	-	+2.42	+0.10	1	-	-
2. ฝ่ายบ้านค่าย						
2.1 เหนือ	-	+12.06	+6.60	-	0.14	6.10
2.2 ทรบ. ฟังซ้าย	-	+12.06	+10.40	1	0.20	0.89
2.3 ทรบ. ฟังขวา	-	+12.06	+10.80	1	0.30	1.38
	หมายเหตุ				รวม	8.363
3. ปตร.คลองโพธิ์	-	+1.40	+0.60	1	-	-
4.โทรมาตรขนาดเล็ก	น้ำฝน	ระดับตลิ่ง	ระดับ ม.	ปริมาณน้ำผ่าน ลบ.ม./วิ		สูง/ต่ำ
	(มม.)	ม.(รทก.)	(รทก.)			จากตลิ่ง
คลองมาบข่า TM01		+30.50	+30.40	-		0.100
คลองสมอ TM02		+31.50	+31.40	-		0.100
คลองหนองหว้า TM03	-	+26.00	+24.66	-		1.340
คลองช้างตาย TM04	-	+21.50	+20.42	-		1.080

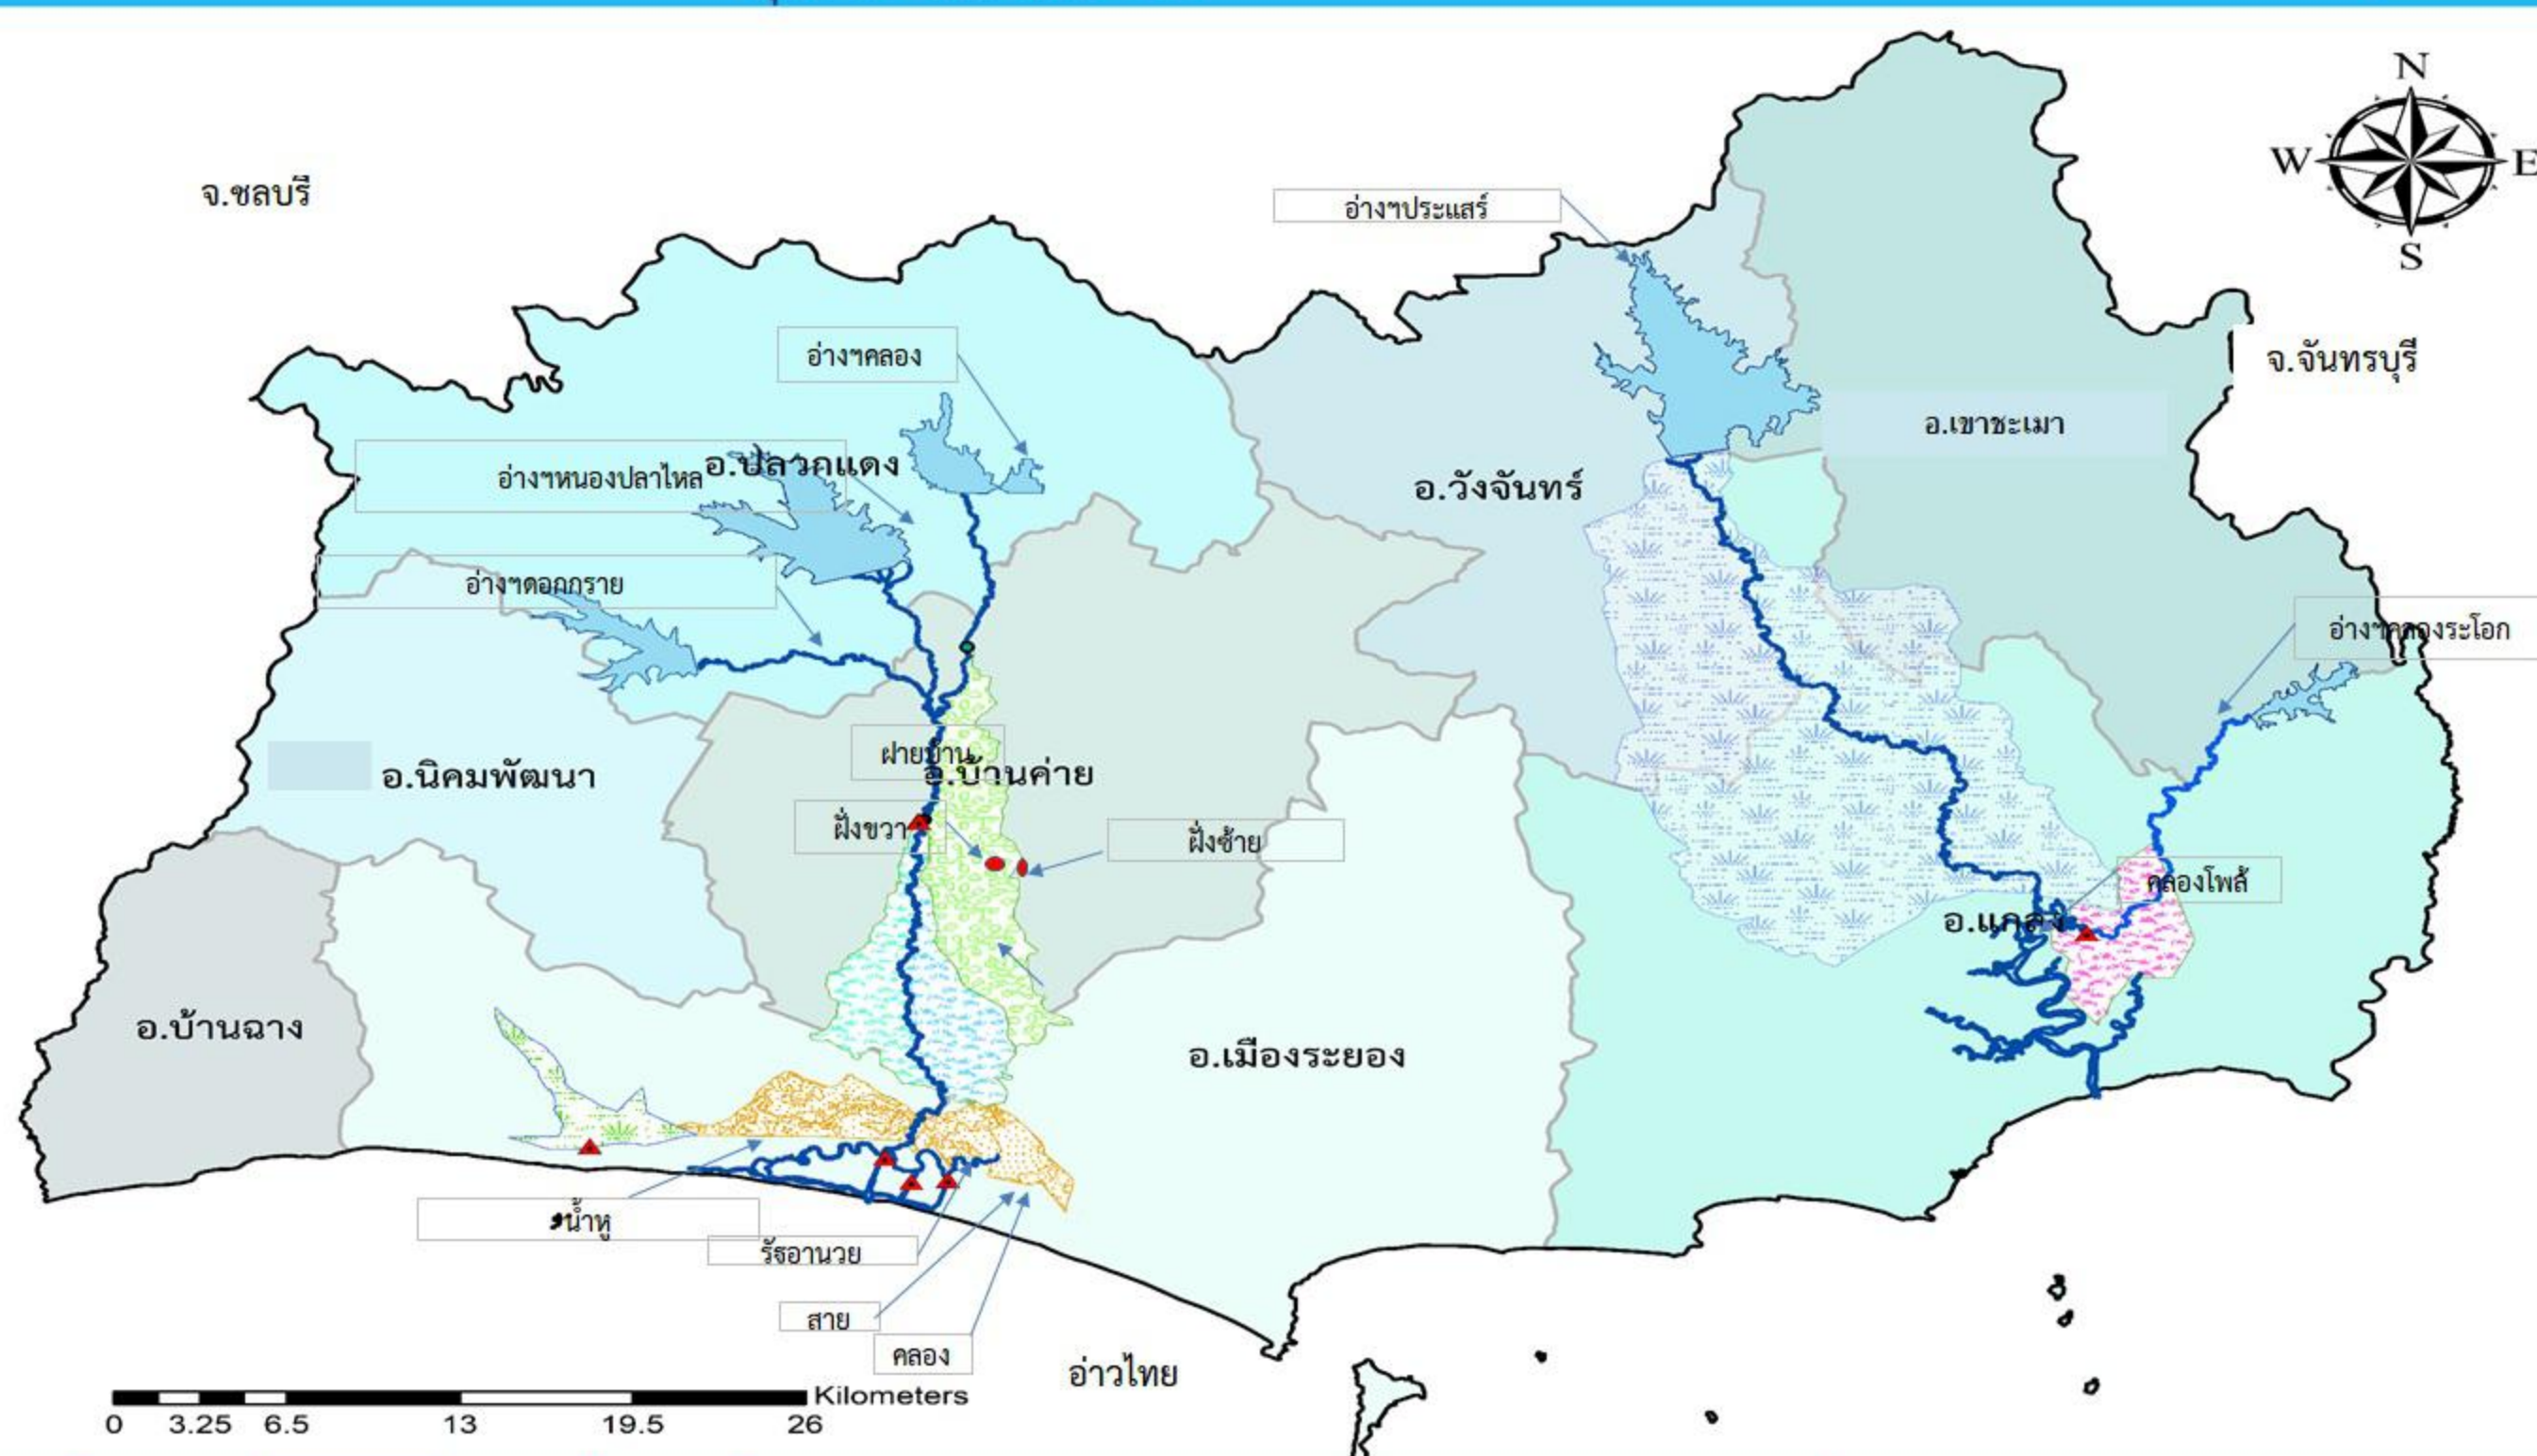

รายชื่อ	ฝน	ระดับน้ำ (ม.รทก.)			ระดับน้ำ (ม.รทก.)		ปริมาณน้ำ ใช้การ	เปอร์เซ็นต์	เปอร์เซ็นต์ (เพิ่มความจุชั่วคราว)	เพิ่มขึ้น ลดลง จากเมื่อวาน (ล้าน ลบ.ม.)	เพิ่มขึ้น ลดลง จากเมื่อวาน (เมตร)	ปริมาณน้ำ						12 มกราคม 2566						
		เก็บกัก	ความจุ (ปกติ)	เพิ่ม ความจุ (ชั่วคราว)	ประจำวัน	ปริมาณน้ำ						OUTLET			SPILLWAY		EMERGENCY		รับน้ำ-ส่งน้ำ (ผันน้ำ)	EASTWATER (น้ำฝาก)	Outflow	น้ำไหลลงอ่าง	ระเหย รั่วซึม	
												เปิดบาน	(ม.3/วินาที)	ล้าน ลบ.ม./วัน	เปิด สิ้น บาน	(ม. ³ /วินาที)	น้ำสูง	(ม. ³ /วินาที)						
อ่างเก็บน้ำ																								
1 ดอกกราย	-	+52.60	71.400	79.411	+52.83	73.965	70.965	103.59%	93.14%	-0.11	↓ -0.1	-	0	-	-	0	-	-	-	-	0.257	0.144	0.051	
2 หนองปลาไหล	-	+45.00	163.750	187.620	+44.95	162.659	149.499	99.33%	86.70%	0.00	➡ .00	5.0%	2.70	0.23	-	-	-	-	รับ	-	รับ	0.835	0.835	0.103
3 คลองใหญ่	-	+46.00	40.100	51.100	+45.70	37.015	34.015	92.31%	72.44%	-0.30	↓ -0.3	20.0%	4.58	0.40	-	-	-	-	ส่ง	-	รับ	0.441	0.137	0.046
ลุ่มน้ำคลองใหญ่			275.250	318.131		273.638	254.478	99.41%	86.01%				7.27	0.63		-		-				1.534	1.117	0.199
4 ประแสร์	-	+35.99	295.000		+35.31	261.550	241.550	88.66%		-0.64	↓ -0.1	0.15	3.73	0.32		-	-	-	ส่ง	0.011	-	0.460	-	0.170
5 คลองระลอก	-	+33.50	19.650		+32.80	16.800	16.600	85.50%		0.00	➡ .00	-	-	-	-	0.70	-	-	-	-	-	0.016	0.016	0.016
ลุ่มน้ำประแสร์			314.650			278.350	258.150	88.46%					3.730	0.322		-		-				0.476	0.016	0.186
รวม			589.900			551.988	512.628	93.57%					11.005	0.951		-		-		-		2.010	1.133	0.386

หมายเหตุ

วิกฤต

ฉุกเฉิน

ปกติ

น้ำดี

กรุณาทดสอบความถูกต้อง ก่อนนำไปใช้งาน

<30.00%

30.01-50.00%

50.01-80.00%

> 80.00%

โครงการชลประทานชลบุรี
จังหวัดชลบุรี



สรุปปริมาณน้ำประจำวัน

สำนักงานชลประทานที่ 9
จังหวัดชลบุรี



13 มกราคม 2566

ลำดับ ที่	รายชื่ออ่างเก็บน้ำ	ระดับน้ำ ม.(รทก.)				ความจุ เก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	ความจุ เก็บกักเพิ่ม (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) 1 พ.ย. 65	ระดับน้ำ ม.(รทก.)			ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำฝน เมื่อวาน (มม.)	ระบายน้ำลงลำน้ำเดิม วันนี้ (ล้าน ลบ.ม /วัน)	คิดเป็น % ของความจุเดิม	คิดเป็น % ของความจุใหม่
		ต่ำสุด	สูงสุด	เก็บกัก	เก็บกักเพิ่ม				12 ม.ค 66	13 ม.ค 66	+/-	12 ม.ค 66	13 ม.ค 66	+/-				
1	อ่างเก็บน้ำบางพระ	+ 20.00	+ 30.60	+30.00		117.0		113.333	+29.200	+29.180	-0.020	103.791	103.508	-0.28	0.0	0.000	88.47	
2	อ่างเก็บน้ำหนองค้อ	+ 57.50	+66.85	+65.60	+66.00	21.40	23.40	22.85	+65.330	+65.320	-0.010	20.155	20.120	-0.04	0.0	0.000	94.02	85.98
3	อ่างเก็บน้ำมาบประชัน	+ 36.00	+ 45.70	+45.50		16.60		16.492	+45.190	+45.190	0.00	15.484	15.484	0.000	0.0	0.000	93.28	
4	อ่างเก็บน้ำชาคนอก	+ 15.60	+ 23.60	+23.00		7.03		7.069	+22.57	+22.56	-0.01	6.238	6.220	-0.02	0.0	0.000	88.48	
5	อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง	+ 51.00	+ 62.00	+61.20		7.65		7.734	+61.11	+61.11	0.00	7.432	7.432	0.000	0.0	0.000	97.15	
6	อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน	+ 67.00	+ 74.94	+74.00		3.84		3.792	+73.34	+73.34	0.00	3.244	3.244	0.000	0.0	0.000	84.48	
7	อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต	+ 57.00	+ 65.88	+65.00		4.80		4.738	+64.72	+64.72	0.00	4.509	4.509	0.000	0.0	0.000	93.93	
8	อ่างเก็บน้ำบ้านปึง	+ 75.20	+ 81.75	+80.80		10.98		9.423	+80.390	+80.380	-0.010	10.300	10.284	-0.02	0.0	0.000	93.67	
9	อ่างเก็บน้ำคลองหลวงฯ	+ 29.00	+ 37.16	+35.50	+36.50	98.00	125.00	108.004	+35.18	+35.15	-0.03	90.991	90.234	-0.76	0.0	0.011	92.08	72.19
10	อ่างเก็บน้ำมาบพิททอง 1	+ 51.00	+ 56.75	+56.25		1.23		1.23	+56.01	+56.00	-0.01	1.182	1.180	-0.00	0.0	0.000	95.93	
11	อ่างเก็บน้ำมาบพิททอง 2	+ 35.00	+41.50	+41.00		2.00		2	+40.77	+40.76	-0.01	1.892	1.887	-0.00	0.0	0.000	94.35	
12	อ่างเก็บน้ำห้วยตู 1	+ 33.00	+37.30	+36.50		1.50		1.5	+36.24	+36.22	-0.02	1.350	1.339	-0.01	0.0	0.000	89.27	
13	อ่างเก็บน้ำห้วยตู 2	+ 46.50	+54.50	+54.00		2.90		2.9	+53.85	+53.84	-0.01	2.804	2.798	-0.01	0.0	0.000	96.47	
	รวม	-	-	-		294.93	323.93	301.06	-		-	269.372	268.239	-1.13	-	0.0112	90.95	82.81
									ระดับน้ำ ม.(รทก.)			ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำฝน เมื่อวาน (มม.)	ปริมาณน้ำเฉลี่ย (ลบ.ม./วินาที)	ระยะยกบาน (ม.)	เปิดบาน (ชม.)
1	ปตร.คลองพานทอง		+1.30	+1.20		1.20			+0.95	+0.95	0.00	1.223	1.223	0.000	0.0	0.000	0.00	0
2	ปตร.ปลายคลองขป.พานทอง		+1.93	+1.50		0.67			+0.88	+0.89	0.01	0.564	0.567	0.003	0.0	0.000	0.00	0
3	ปตร.ต้นคลองขป.พานทอง		+1.70	+1.70		-			+0.92	+0.92	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	-	-	-

